

# FICHA DE PROYECTO

## SUPERASAFALTO AV. ESTEBAN ARCE DESDE PUENTE PASOS KANKI HASTA ARCO PAMPAHASI

Macrodistrito:	SAN ANTONIO	Area Organizacional Responsable:	SMIP	Fecha actualización:	25/10/2023
Distrito:	5	Responsable del llenado:	Jorge Saavedra	Fuente de datos:	SGEO, SIMv2, SIMCont. y Sub.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DATOS DEL PROYECTO
	Nombre del proyecto: SUPERASAFALTO AV. ESTEBAN ARCE DESDE PUENTE PASOS KANKI HASTA ARCO PAMPAHASI
	Año de ejecución: 2023
	Tipo de proyecto: CONSTRUCCION
	Cod. SISIN: 12011424600000
	Poblacion Benefic: 4.845 Hab.

**OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROYECTO**  
MEJORAR 277,65 M2 DE LA CAPA DE RODADUR Y LAS CONDICIONES DE CIRCULACION VEHICULAR Y PEATONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DEL ENLOSETADO DE LA CALZADA

COMPONENTES / RUBROS PRINCIPALES DEL PROYECTO	
1. LIMPIEZA	20.000 m2
2. FRESADO	30.000 m2
3. ASFALTO NUEVO	30.000 m2
4. LEVANTAMIENTO DE TAPAS	175
5. SEÑALIZACION VERTICAL	79
6. SEÑALIZACION HORIZONTAL	300 m2

### LOCALIZACION DEL PROYECTO



LOCALIZACION DEL PROYECTO	
Macrodistrito	Hampaturi
Distrito	22
Zona	Cheka Chinchaya Alto
Direccion	
Coordenadas (Latitud, longitud)	



DATOS DEL CONTRATO	
Monto total Contrato Adjudicado	28.000.000,00
Fuente de Financiamiento	Fondo de Atencion Ciudadana (FAC)
Modalidad de Contratacion	DIRECTA
Empresa adjudicada	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA NEYZA CASTILLO "NCM"
Cod. Contrato	OBN-506-2023
Supervisión/Supervisor	ARQ. DANIEL CHINAHUANCA VENTURA
Fiscalización/Fiscal	ARQ. ELISA VALENZUELA AYALA
Orden de Proceder Obra (Inicio):	20/9/2023
Plazo de ejecucion (DC.):	180
Contrato Modificatorio	
Orden de cambio	

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO			
Estado:	FIRMA CONTRATO		
Avance fisico:	92%		
Avance financiero	76%		
Anticipo SI	Porcentaje: 20%	Monto Bs.	5.600.000,00
Acta provisional (actual o prevista)	18/3/2024		
Periodo de Prueba (DC):	30		
Acta definitiva (actual o prevista)	17/4/2024		
Descripcion actual del estado del proyecto			

### INDICADORES DEL PROYECTO

INDICADORES AVANCE FINANCIERO			
INDICADOR	FORMULA	COEFICIENTE	
A. VARIACION EN AVANCE FINANCIERO	PGM-EJC		
B. INDICE DESEMPEÑO FINANCIERO	PGM/EJC		
C.			
D.			
E.			

INDICADORES AVANCE FISICO			
INDICADOR	FORMULA	COEFICIENTE	
A. VARIACION EN AVANCE FISICO	PGM-EJC	-7,84%	
B. INDICE DESEMPEÑO FISICO	PGM/EJC	92%	
C.			
D.			
E.			

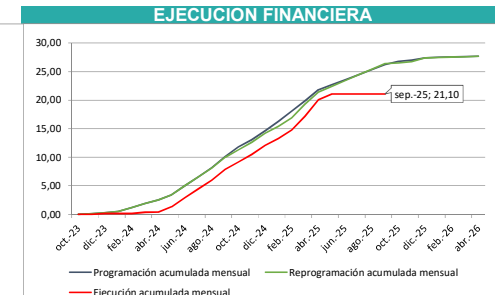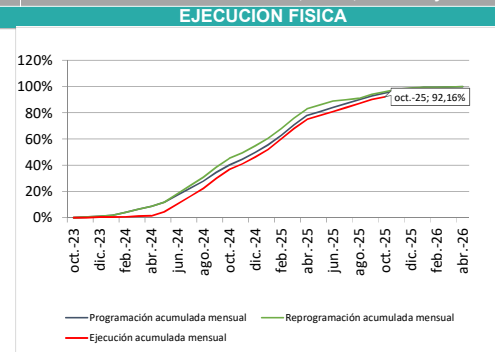

### EJECUCION POR RUBROS

